



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

RENCANA AKSI

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021



KEMENTERIAN RISET
TEKNOLOGI DAN INOVASI
REPUBLIK INDONESIA

[illegible]

[illegible]




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II (APRIL - JUNI)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021



•

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Project Information										Financial Data										Operational Metrics										Compliance & Risk									
Project ID	Name	Manager	Status	Start Date	End Date	Budget	Actual Cost	Variance	ROI	Revenue	Profit	Units Produced	Quality Score	Defect Rate	Customer Sat.	Compliance	Risk Level	Mitigation	Impact	Frequency	Severity	Owner	Due Date	Resolution	Feedback														
P001	Project Alpha	J. Doe	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$1,200,000	\$1,150,000	\$50,000	15%	\$2,500,000	\$1,200,000	15,000	95%	0.5%	4.8/5	ISO 9001	Low	Regular Audits	Minor	Quarterly	Medium	John Smith	2023-04-15	Resolved	Positive														
P002	Project Beta	A. Smith	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$800,000	\$780,000	\$20,000	10%	\$1,800,000	\$850,000	12,000	92%	0.8%	4.5/5	ISO 9001	Medium	Weekly Reviews	Minor	Monthly	Low	Sarah Johnson	2023-07-10	Open	Neutral														
P003	Project Gamma	M. Lee	On Hold	2023-05-01	2023-08-31	\$500,000	\$520,000	-\$20,000	-5%	\$900,000	\$450,000	8,000	88%	1.2%	4.2/5	ISO 9001	High	Monthly Audits	Major	Quarterly	High	David Brown	2023-09-01	Open	Negative														
P004	Project Delta	K. White	Completed	2023-02-01	2023-04-30	\$300,000	\$310,000	-\$10,000	5%	\$600,000	\$300,000	5,000	90%	0.3%	4.6/5	ISO 9001	Low	Annual Review	Minor	Annual	Low	Emily Davis	2023-05-15	Resolved	Positive														
P005	Project Epsilon	L. Green	In Progress	2023-06-01	2023-09-30	\$1,500,000	\$1,600,000	-\$100,000	20%	\$3,000,000	\$1,500,000	18,000	97%	0.2%	4.9/5	ISO 9001	Low	Continuous Monitoring	Minor	Weekly	Low	Michael Chen	2023-10-01	Open	Positive														





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON II TRIWULAN II

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA (RENCANA AKSI)**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kinerja Triwulan		Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Keterangan
				Capaian	%			Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	73,51%	0,00	0,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	18.349.693.000,00	4.657.286.239,00	25,38	Realisasi Kinerja belum bisa terukur sesuai target karena masih tahap pelaksanaan pekerjaan begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih/Air Minum yang Aman	100%	0,00	0,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.972.070.900,00	4.848.710.196,00	37,38	Realisasi Kinerja belum bisa terukur sesuai target karena masih tahap pelaksanaan pekerjaan begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Perumahan	Persentase Penduduk yang Tersedia Sarana Pengelolaan Air Limbah	100%	0,00	0,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.333.453.000,00	2.349.398.800,00	25,17	Realisasi Kinerja belum bisa terukur sesuai target karena masih tahap pelaksanaan pekerjaan begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana
4	Meningkatnya Kualitas Gedung dan Prasarana Pemerintahan	Persentase Gedung dan Prasarana Pemerintah dalam Kondisi Baik	100%	0,00	0,00	Program Penataan Bangunan Gedung	12.354.370.201,00	5.144.891.210,91	41,64	Realisasi Kinerja belum bisa terukur sesuai target karena masih tahap pelaksanaan pekerjaan begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	51,49%	0,00	0,00	Program Penyelenggaraan Jalan	68.485.932.650,00	6.784.310.824,00	9,91	Realisasi Kinerja belum bisa terukur sesuai target karena masih tahap pelaksanaan pekerjaan begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana
6	Meningkatnya SDM Penggajian, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih	100%	0,00	0,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	175.107.150,00	9.415.650,00	5,38	Realisasi Kinerja belum ada karena hasil koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Juli mengingat padataunya jadwal belai sampai triwulan kedua begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana.

7	Meningkatnya Kesesuaian Pemenuhan Ruang terhadap Rencana tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap KTRW	100%	100,00	100,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	334.742.440,00	77.894.120,00	23,27	Realisasi Kinerja sesuai target (bahwa Rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah permohonan yang masuk, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana
---	---	-----------------------------------	------	--------	--------	--	----------------	---------------	-------	---

Sinjai, 30 Juni 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SAMPAL DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

1. Pengukuran Indikator Sasaran Ke-1 : Meningkatkan Kinerja Layanan Irigasi

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	4	5	6	7	8	9 = (8/4*100)
1			73,51%	(Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik)/(Luas Irigasi Kabupaten) X 100 %	Data Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Sinjai Panjang Irigasi yang Ditingkatkan Jumlah Daerah Irigasi yang Dipelihara	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dibagi dengan Luas Irigasi Kabupaten, kemudian Dikalikan dengan 100 Persen	0,00	0,00

2. Pengukuran Indikator Sasaran Ke-2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Air Bersih untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih/Air Minum yang Aman	%	4	5	6	7	8	9 = (8/4*100)
1			100%	(Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Air Bersih /AirMinum)/(Jumlah Penduduk) X 100%	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sinjai Jumlah Penduduk yang Terlayani Jaringan Air Minum secara Layak	Penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih/air minum dibagi dengan jumlah penduduk dikemudian dikalikan dengan 100 persen	0,00	0,00

3. Pengukuran Indikator Sasaran Ke-3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Permukiman

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	Persentase Penduduk yang Terlayani Sarana Pengelolaan Air Limbah	%	100%	$(\text{Penduduk yang Terlayani Sarana Pengelolaan Air Limbah yang Memadai}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \times 100\%$	6	7	8	$9 = (8/4 \times 100)$
					Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai dibagi dengan jumlah penduduk kemudian dikalikan dengan 100 persen	0,00	0,00

4. Pengukuran Indikator Sasaran Ke-4 : Meningkatkan Kualitas Gedung dan Prasarana Pemerintahan

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	Persentase Gedung dan Prasarana Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	100%	$(\text{Realisasi Bangunan Gedung Pemerintah yang Ditangani dalam Satu Tahun}) / (\text{Target Bangunan Gedung yang Ditangani dalam Satu Tahun}) \times 100\%$	6	7	8	$9 = (8/4 \times 100)$
					Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang Ditangani dalam Satu Tahun	Realisasi bangunan gedung pemerintah yang ditangani dibagi dengan target bangunan gedung pemerintah yang ditangani, kemudian dikali dengan 100 persen	0,00	0,00

5. Pengukuran Indikator Sasaran Ke-5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	3	4	5	6	7	8	9 = (8/4*100)
1		%	51,49%	(Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondist Mantap) / (Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut) X 100 %	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Panjang jalan yang Dikerjakan Panjang jalan yang Dipelihara	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut, kemudian dikalikan dengan 100 persen	0,00	0,00

6. Pengukuran Indikator Sasaran Ke-6: Meningkatkan SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih	3	4	5	6	7	8	9 = (8/4*100)
1		%	100%	(Realisast Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih) / (Target Pelaku Ja sa Konstruksi yang Terlatih) X 100 %	Data Tenaga Konstruksi yang Lulus Sertifikat	Realisasi pelaku jasa konstruksi yang terlatih dibagi dengan target pelaku jasa konstruksi yang terlatih, kemudian dikali dengan 100 persen	0,00	0,00

7. Pengukuran Indikator Sasaran Ke-7: Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana tata Ruang

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/4*100)
1	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	$(Realisasi\ RTRW) / (Rencana\ Peruntukan) \times 100\ %$	Data Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Realisasi RTRW dibagi dengan Rencana Peruntukan, kemudian dikalikan dengan 100 Persen	100,00	100,00

Sinjai, 30 Juni 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


IR. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III TRIWULAN II

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021

**REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II
ESELON III SEKRETARIAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Indikator Program	Satuan	Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
											Rp	Kou, (%)	Capaian Kinerja	Presentase		
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Aparatur	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Sekretariat dan PD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelayanan Kinerja	%	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelayanan Kinerja	Persen	8.340.038.857,00	6 Bulan (50%)	3.502.172.201,00	3,78	1 Dok., 1 Lap., 6 Lap., 6 Lap. Keu, 71 Orang, 6 Bin (50%), 3 Orang, 6 Bin (50%), 6 Bin (50%), 6 Bin (50%), 6 Bin (50%), 6 Bin (50%), 6 Bin (50%), 6 Bin (50%), 16 Unit, 27 Unit, 8 Unit, 3 Unit, 14 Unit, 16 Unit	42,18	Sekretaris	Realisasi Kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana

Sinjai, 30 Juni 2021

Ditujukan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


M. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk I
Nip. 19641214 196303 1 010


NAZARUDDIN TAHAR, ST.
Nip. 19720128 200312 1 003

**REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II
ESELON III BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Indikator Program	Satuan	Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
											Rp	Keu. (%)	Capaian Kinerja	Presentase		
1	Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi yang Handal untuk Menunjang Keadulatan Pangan	Rasio jaring irigasi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pertentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	18.348.663.000,00	0,00	4.657.296.239,00	4,79	1 Dokumen	24,46	Kabid. Sumber Daya Air	Realisasi kinerja belum bisa terukur sesuai target, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana

Sinjai, 30 Juni 2021
Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai,


M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng.
Nip. 19640126 200604 1 001

Disetujui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pengkal : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198003 1 010

**REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II
ESELON III BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Indikator Program	Satuan	Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
											Rp	Keu. (%)	Capaian Kinerja	Presentase		
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penduduk terhadap sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman	%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen	12.972.070.900,00	0	4.848.710.195,00	4,88	-	0,00	Kabid. Cipta Karya	Realisasi Kinerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya masih Rp. 0
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penduduk terhadap sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik	Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Permukiman	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengolahan air limbah	%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	9.333.453.000,00	0	2.349.396.800,00	2,38	3 Unit (25 RT)	24,00	Kabid. Cipta Karya	Realisasi Kinerja belum bisa terukur sesuai target kinerja yang ditetapkan karena masih tahap pelaksanaan pekerjaan, sedangkan realisasi anggaran sudah ada
3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Meningkatnya Kualitas Gedung dan Prasarana Pemerintahan	Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam	%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Capaian bangunan gedung negara yang dilayani	Persen	100.000.000,00	0	0,00	0,00	-	0,00	Kabid. Cipta Karya	Pada triwulan kedua belum ada rencana kinerja yang ditetapkan, Realisasi Kinerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya

4	Meningkatkan Kualitas gedung pemerintah Infrastruktur dalam kondisi tur Dasar baik	Meningkatkan Kualitas Gedung dan Prasarana Pemerintahan	Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam	%	Program Penataan Bangunan Gedung	Capaian bangunan gedung negara yang ditangani	Persen	12.364.370.201,00	0	5.144.891.210,01	0,32	0,00	0,00	Kabid. Cipta Karya	Pada triwulan kedua ada target kinerja yang ditetapkan Realisasi Kinerja belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya
---	--	---	--	---	----------------------------------	---	--------	-------------------	---	------------------	------	------	------	--------------------	---

Sinjai, 30 Juni 2021

Ditujukan:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai,


E. ANDI TAUFIQ SAMUDRA M.T.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010


MUHAMMAD SAERIIAR, ST., MM
Nip. 19710829 200312 1 002

**REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II
ESELON III BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Indikator Program	Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
										Rp	Keu. (%)	Capaian Kinerja	Presentase		
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	66.485.932.650,00	0,00	6.784.310.834,00	4,61	3,81 Km, 3,30 Km	12,08	Kabid Bina Marga	Realisasi Kinerja belum ada sesuai target yang ditetapkan meskipun pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan, sedangkan realisasi anggaran sudah ada

Disetujui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 196903 1 010

Sinjai, 30 Juni 2021

Pt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai



A. ADNAN N. M. MUBRON, S.ST., MT.
Nip. 197805200604 1 019

**REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II
ESELON III BIDANG JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Indikator Program	Satuan	Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
											Rp	Kel. (%)	Capaian Kinerja	Presentase		
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan dan pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya SDM pengguna penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi (IUIJK)	Persen	175.107.150,00	0,00	9.412.650,00	0,01	1 BUIJK	2,50	Kabid. Jasa Konstruksi	Realisasi Kinerja belum ada karena hasil koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, begitupun dengan realisasi anggarannya belum ada atau Rp. 0 sudah ada

Direktur
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Sinjai, 30 Juni 2021

Kepala Bidang Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. II
Nip. 19641214 198003 1 010

HL. NURASIBAH S. Sos. MM
Nip. 19771119 200701 2 012

**REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II
ESELON III BIDANG PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Indikator Program	Satuan	Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
											Rp	Kou. (%)	Capaian Kinerja	Presentase		
1	Menciptakan Penataan Ruang yang Konsisten	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	334.742.440,00	0,00	77.894.120,00	0,06	3 Lokasi Taman, 12 Rekomendasi	50,00	Kabid. Penataan Ruang	Realisasi Kinerja sesuai target, sedangkan realisasi anggaran sudah ada

Disetujui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI YAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk I
Nip. 19841214 198903 1 010

Sinjai, 30 Juni 2021

Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai,


ABAM, ST.
Nip. 19780113 200801 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON IV TRIWULAN II

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021



INDIAN PLAINS PIERCE, ANNA, AND THE THUNDER, ANN 8

[Signature]

[Signature]

LEGAL MINDS **WANT TO BE A PART OF THE TEAM?**

[illegible]

主 要 成 分

1000

www.elsevier.com/locate/jmb

1

Journal of Interpersonal Violence

10

[illegible]

1

5

و

5

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

Yacht Services

10

**REALISASI RENCANA KERJA TAHUNAN 2021
SEKELAH Negeri PENGUNCIAN DAN PENGENDALIAN KECAPTAKRYAN
DNAS PETAJARAN LUMBAN DAN PENYATAAN RUMAH KABUPATEN SELAJA
TAMER ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Indikator Program	Status	Anggaran	Target	Realisasi Keuangan			Realisasi Kinerja			Realisasi Fisik		Penyakit	Jumlah	Indikator
							No	Anggaran	Realisasi (%)	No	Anggaran	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	
1	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu
2	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu
3	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu

Salah, 02 Jan 2021


 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Selaja


 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Selaja

REAL-PLANE RECOGNITION AND TRAINING I

[illegible]

註冊商標

1

A

100

REDAJAS RENCANA SPESIFIK TITIKULAN N
BESIKON INI BERUPA PELAKSANAAN PENYATAAN RENCANA DAN PENGEMBANGAN PERUMBUHAN
DINAS PERUMBUHAN UMUM DAN PENYATAAN RENCANA KADISTAN BERAS
TAMBAH ANGGARAN 2021

[illegible]

MARSHALL MARIN J.A.S.P. INC.
The construction people's choice

Overseas:
Anglo Italian Cable Corp.
Cyprus International Cable Project
A Group with a Future

3014 30-11-2013
 Jan. Pöhlmann (Leitung) 100
 3014 30-11-2013
 3014 30-11-2013

A. Candidate _____
 Date: _____
 Mark: _____



REALISASI KEMERDEKAAN AKSI TRISULAM

No	Indikator Tujuan	Indikator Outcome	Materi	Program	Indikator Program	Northstar / Financiar		Northstar Outcome		Keputusan Perilaku	Keputusan	Sub-Keputusan	Indikator Sub-Keputusan	Northstar Keuangan		Northstar Risiko		Target	Northstar Strategi		Kategori
						Sp.	Has. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)					Sp.	Ris. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)		Sp.	Ris. (%)	
1	Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari	Penggunaan layanan kesehatan mental oleh mahasiswa	Program Pengkaderan Mahasiswa	Program Pengkaderan Mahasiswa	Penggunaan layanan kesehatan mental oleh mahasiswa	Sp.	Has. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)	Sp.	Ris. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)	Sp.	Ris. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)	Target	Indikator Sub-Keputusan	Sub-Keputusan	Kategori
2	Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari	Penggunaan layanan kesehatan mental oleh mahasiswa	Program Pengkaderan Mahasiswa	Program Pengkaderan Mahasiswa	Penggunaan layanan kesehatan mental oleh mahasiswa	Sp.	Has. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)	Sp.	Ris. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)	Sp.	Ris. (%)	Capaian Kinerja	Ris. (%)	Target	Indikator Sub-Keputusan	Sub-Keputusan	Kategori

Kauf: Permutation der Vorgeordneten Knoten erzeugt
Dense Matrix (alle Knoten sind auf sich selbst verknüpft)
Dense Matrix (alle Knoten sind auf sich selbst verknüpft)

[illegible]

Signature of Agent

S. CHRISTOPHER J. BERT, JR.,
FBI - NEW YORK

[Signature]

REALIDADE ECONÓMICA ANTE TROVÃO EM 11

[illegible]

Volume 100, April 2000

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Phyllis —

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1000

David Heston, President
David Heston, President
David Heston, President

12

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

© 2002 Blackwell Science Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395-402

18. Signature
Date: 11/10/2019

REALIZING OUR COMMON VISION FOR TOMORROW

[Handwritten signature]

WILLIAM L. HARRIS, JR.

LET US PLEASE REMEMBER THAT, SINCE THE BEGINNING, 1929



L
A
M
P
I
R
A
N



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92013

Sinjai, 28 Juni 2021

Kepada

Nomor : 800/06.267/DPUPR/VI/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2021

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR;
5. Staf Dinas PUPR;
Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka akan dilakukan rapat evaluasi kinerja lingkup Dinas.

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Saudara(i) agar menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Waktu : 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP.196412141989031010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92013

Sinjai, 28 Juni 2021

Kepada


Nomor : 800/06.266/DPUPR/VI/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan II Tahun
Anggaran 2021

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR;
5. Staf Dinas PUPR;
Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2021 pada Subbagian Program paling lambat tanggal 1 Juli 2021.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP.196412141989031010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : Ruang Rapat DPUPR
Tanggal/Bulan/Thn : 1 Juli 2021
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. Tanjung	Kas. S	1.
2.	Nazaruddin Taha	SE/K	2.
3.	NURHERMAWATI	KASUBBAG PROGRAM	3.
4.	SABRI	KASUBD CU	4.
5.	AKMAL	Kasi Pengaturan Takar	5.
6.	BASSI HATTA	Kasub SDA	6.
7.	M Ridwan Puz	Kasie Pemb. SDA	7.
8.	NURFAH	KASI PENGAWASAN JAKOH	8.
9.	SAMSU ALAM	Kasi Perencanaan BM	9.
10.	ILHAM	KASUB P. KEARIF	10.
11.	WENI DUNIAWA	Bendahara pengeluaran	11.
12.	RUSMIAWATI	Kasubke Ulu	12.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21048 - 21488 SINJAI 92813

13.	EDY HAPIL	Kasubag Umum & Kap	13.	
14.	ABUL HARI	Kasi Pergerakan & Pambinaan Tr	14.	
15.	Andi Akun	Kasi Preservasi BM	15.	
16.	Munawhyr Rzuliyatun	Staff	16.	
17.	Ummi Saadah Darmawan	Staff	17.	
18.			18.	
19.			19.	
20.			20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	

Sinjai,

Notulis,

Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. Andi Taufiq Saleh, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Pukul : 09.30 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Sinjai
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Moderator : Sekretaris Dinas
Notulis : Kasubbag. Program
Peserta Rapat :
1. Kabid. SDA
2. Kabid. Cipta Karya
3. Kabid. Penataan Ruang
4. Kasi. Konservasi Kebanmargaan
5. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Kebanmargaan
6. Kasi. Pelaksana SDA
7. Kasi Pengaturan Jasa Konstruksi
8. Kasi. Pengawasan Jasa Konstruksi
9. Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
10. Kasubbag. Keuangan
11. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
12. Staf Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)

Materi Rapat:

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja sampai triwulan II, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas selaku Moderator untuk melaksanakan rapat yang akan membiicarakan terkait evaluasi program kegiatan tahun 2021 dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2021.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Dalam rangka evaluasi, Rapat terkait realisasi kinerja untuk kedua kalinya dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dan meminta agar kedepannya tetap melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan agar kendala yang dihadapi cepat teratasi, dan untuk mempersingkat waktu pemimpin rapat kembali mempersilahkan moderator untuk mengendalikan rapat.

Penyampaian kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2021:

1. **Dari Bapak Muhammad Sabri AR, ST., MM.** selaku Kepala Bidang Cipta Karya menjelaskan terkait kegiatan yang ada di Bidangnya:

- Pertama untuk kegiatan pembangunan SPAM sejauh ini Alhamdulillah realisasi kinerja sebesar 25% dan Insya Allah beberapa minggu ke depan akan melakukan penagihan untuk tahap selanjutnya. untuk Progress fisik memang sejauh ini masih agak rendah dikisaran 30-50 % karena bahan2nya berupa pipa banyak yang belum ada di lokasi, tapi begitu pipa ada di lokasi akan mendongkrak progresnya. dan kami optimis akan selesai dengan waktu yang ditetapkan di pertengahan bulan agustus.
- Untuk kegiatan sanitasi realisasi keuangan itu sudah terealisasi semua untuk 19 paket dengan realisasi fisik rata-rata 25% keuangan dan fisik masih diangka 20%-30% karena item utama dari sanitasi untuk saat ini juga belum tiba pengiriman tangki septik dan tangki komunal tapi Insya Allah mungkin minggu ini dan paling lambat minggu depan sudah siap bersaing di lapangan dan ketika sudah siap tangkinya otomatis sudah bisa mendongkrak realisasi pelaksanaan
- Untuk kegiatan SPAM perkotaan untuk realisasi keuangan baru 60% dan Insya Allah minggu kedua ditargetkan, di minggu kedua bulan juli kegiatan akan diselesaikan dan dapat segera direalisasikan keuangannya sebesar 100% kendala untuk saat ini untuk pemadatan dan perbaikan jalan yang sudah di potong dan rekanan mengalami hambatan untuk penyediaan alatnya, ketersediaan alat dan bahan dan sudah dikoordinasikan dengan bidang bina marga untuk bisa mensupport kegiatan kami.
- Untuk kegiatan lainnya yaitu rehabilitasi gedung hibah gedung kantor untuk realisasi keuangan masih nol sampai saat ini karena sempat ada kesalahan dalam penginputan di

SIPD kemarin tapi kami sudah melakukan perbaikan dan target untuk minggu ke depan agar bisa segera ada pencairan adapun untuk progress fisiknya sudah cukup sesuai dengan kontrak sekitar 30%-50%, untuk rehabilitasi rumah negara untuk progress keuangan juga belum ada realisasi hingga saat ini tapi untuk realisasi fisknya 25%-30%.

- Untuk kegiatan pembangunan Islamic center sejauh ini progress keuangan baru 48%, progress fisik 90% tapi sekarang sudah melakukan proses pencairan untuk tahap III sebesar 85%. Untuk kegiatan Islamic center ini kami targetkan akan berakhir di bulan agustus mengingat bahwa untuk pekerjaan finishing itu memang membutuhkan cukup waktu untuk penyelesaiannya.
- Untuk PAD penyedotan lumpur tinja untuk target tahun ini 5 juta sekarang realisasi sudah 3 juta. dan untuk izin bangunan ini masih jauh dari target sesuai dengan target yang ditetapkan 370 juta realisasi sampai saat ini masih sekitar 7%, sebenarnya harapan kami tahun ini ada kondisi keuangan lebih bagus masyarakat lebih bagus dengan harapan covid akan ini berkurang tapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak banyak berubah dari tahun lalu, masih kurang masyarakat yang mengurus IMB tapi kita tetap berusaha untuk tetap memaksimalkan PAD setidaknya tidak terlalu jauh dari target yang kita tetapkan
 - Arahan Pak Kadis, khusus untuk cipta karya karena disitu ada PAD kita harus penuhi untuk izin bangunan dan lumpur tinja jdi klu memang belum mencapai target tolong carikan alasannya mengapa, karena pasti untuk pertemuan kita nanti akan pasti pertanyaan soal PAD, jadi mungkin klu PAD kita tdk bisa penuhi bisa dilakukan revisi.

2. **Dari Bapak Andi Adnan, S.ST., MT.,** selaku Kepala Seksi Preservasi Kebinamargaan sekaligus Plt. Kepala Bidang Bina Marga menjelaskan:

- Untuk pekerjaan jalan yang sumber anggaranya dari DID nilai pagu 10 milyar yang dikerjakan oleh PT. Macolli lolo terdiri atas 3 ruas jalan ini masih sebelum difocusing realisasi fisiknya sudah di atas 45% berdasarkan laporan dari konsultan
- Peningkatan jalan DID paket II ini agak kritis baru 2,42%, yang dikerjakan oleh PT ilham jaya konstruksi, tapi informasi terakhir yang saya dapat sudah memulai memobilisasi peralatan dan material dan sudah ditetapkan oleh direksi dan konsultan pengawas untuk segera mengambil tindakan percepatan pelaksanaan pekerjaan
- Peningkatan jalan ruas did tahap II yang merupakan pekerjaan lanjutan realisasi fisik itu sudah di angka 100%
- Selanjutnya peningkatan jalan did tahap III ini terdiri dari ruas jalan flamboyan, jalan Sultan Hasanuddin, jalan bulu lasiai sudah terealisasi 100% dan tersisa di dua ruas karumassing-bonto katute dan lanjutan ruas barambang-air terjun posisi realisasi sampai saat ini berada di angka 65%. Sekedar penyampaian bahwa untuk ruas jalan barambang -air terjun ini karena dalam 1 ruas ada 2 paket pekerjaan, paket pekerjaan DID tahap I itu sudah selesai 100% na ini harus menunggu dulu umur betonnya, sebulan kemudian masuk di dilanjutkan lagi berkisar 800 meter.
- Selanjutnya untuk pemb jembatan ini fisik masih 0% kenapa ini sampai terlambat ini karena nilai perencanaanya kemarin cuma 10.500.000 dan paket perencanaan ini agak lama mencari yang bisa mendesain. Tapi Alhamdulillah

perencanaan jembatan sudah selesai dan perencanaan baru di stor di PBJ dan secara administrasi harus menunggu dua minggu kedepan baru pelaksanaan fisik baru bisa dilelang.

- Untuk pemeliharaan jalan posisi sekarang sudah di atas 70 %, cuma untuk realisasi keuangan belum dan sementara berproses.
- Dari total keseluruhan kegiatan di Bina Marga yang jadi perhatian yang sudah terkontrak ini di peningkatan DID Tahap II yang dikerjakan PT. Ilham Jaya Konstruksi dan sekedar penyampaian juga untuk ruas jalan kemarin di MOU kejaksaan sudah ditinjau langsung untuk 2 ruas jalan ini minggu lalu sudah turun di lokasi dan menyampaikan kendala yang kami hadapi di lapangan. Khusus untuk sinjai barat, tengah dan borong berdasarkan data yang dikeluarkan oleh konsultan dan pelaksana itu intensitas hujan memang mulai dari bulan desember sampai ketemu lagi di musim hujan ini tinggi intensitas hujannya. dan ini sudah disampaikan ke sahabat kita lebih awal jangan sampai di kemudian hari jadi masalah dan kami juga sudah backup secara administrasi data penunjangnya kenapa pekerjaan bisa lambat realisasinya.

- Arahan pak kadis khusus bidang bina marga mengenai proyek jembatan sebelum di masukkan di PBJ harus di reviu oleh inspektorat. Dan meminta kepada penanggung jawab kegiatan untuk kegiatan masih rendah capaiannya untuk rutin diadakan pertemuan dengan pelaksananya kemudian klu perlu desak pelaksananya bekerja lebih professional dengan menyiapkan segala kebutuhan yang bisa disiapkan untuk memproses pekerjaan bisa mencapai volume sesuai target.

3. **Dari Bapak M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng.,** selaku Kepala Bidang SDA menjelaskan:

Secara umum kami sudah melihat laporan untuk kemajuan sampai triwulan II, Kegiatan Rehabilitasi Irigasi yang bersumber dari dana DAK hampir seluruhnya sudah memulai pekerjaan meskipun ada beberapa titik sebenarnya yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu ada 3 di sinjai barat dan 2 di Tellulimpoe dan sepertinya tippulue yang sampai sekarang masih perlu penambahan dan mungkin nanti dijelaskan sendiri oleh PPKnya dan kami hanya memberikan gambaran secara umum bahwa di Sinjai Barat itu di Di Barang, tonrong, tambariang, kampala kemudian yang kami jelaskan di Tippulue yang masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari PPK masih perlu dikejar lagi untuk diperbaiki. Sedangkan yang di Sinjai Barat mungkin katakanlah sudah ada peningkatan progress sampai saat ini.

Selanjutnya untuk kegiatan yang lain, kami melaporkan bahwa untuk belanja pemeliharaan saluran itu sudah di angka 70% kemudian untuk penjaga pintu airnya sudah 50%.

Untuk perencanaan irigasi sudah selesai 100%

Dan untuk dokumen UKL/UPL lamole, teko dan embung ini terkendala di persentase akhirnya belum dilaksanakan sehingga progress presentase masih 70%, sisa menunggu persentase akhir.

4. **Dari Bapak M. Ridwan Jaya, ST., MM,** selaku penanggungjawab kegiatan menjelaskan:

Terkait kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi ada 5 titik yang sampai saat ini masih mengalami keterlambatan, tapi dari 5 titik itu juga saya Insya Allah tetap optimis karena kondisi sekarang khususnya di sinjai barat itu sudah action untuk

penyelesaian pekerjaannya, demikian pula di kalobba ada 2 paket disana untuk paket DI barang untuk sekarang sudah jalan dan untuk DI Tippulue yang slama ini jadi permasalahan Alhamdulillah tiga hari lalu besinya sudah masuk, sisa saya sarankan untuk menambah tenaga di 5 titik.

Kemarin khusus di tippulue yang jadi kendala itu pengadaan besinya, karena pihak kontraktor pelaksana ngotot cari besi yang 12 blue sedangkan dipasaran agak susah, kemarin saya sarankan untuk apa yang menjadi prasyarat yang penting ada sertifikasinya , karena dengan dasar berat jenis sertifikasi itu klu memang tidak bisa mencukupi kami akan CCO.

Temuan tahun lalu terkait di pembesian karena sigmanya tidak mencukupi. Dan tahun ini kami sarankan yang menggunakan pengecoran harus sediakan sertifikatnya.

Arahan Pak Kadis memberikan arahan untuk bidang sumber daya air untuk jangan bosan-bosan untuk mendesak mereka untuk pekerjaan lebih serius lagi dengan penambahan tenaga-tenaga dan segala macam klu bisa aktifkan penjaga pintu yang ada di sekitar lokasi untuk memantau, mengawasi pelaksanaan yang klu ada hal-hal yang mungkin menyalahi agar melapor ke PPKnya atau pak Kabidnya.

5. **Dari Bapak Akmal, S.Sos,** penanggung jawab kegiatan di Bidang Jasa konstruksi:

Menjelaskan bahwa di bidang jasa konstruksi untuh tahun ini ada 2 kegiatan yaitu pelatihan tenaga terampil dan IUJK, tetapi perlu kami melaporkan bahwa berdasarkan undang-undang Cipta Kerja, IUJK ditiadakan tetapi perlu kami sampikan bahwa kemarin tetap menjadi syarat tender itu surat izin usaha jasa konstruksi dan mereka tetap membutuhkan rekomendasi

teknis dari PUPR. Jadi harapan kami untuk tahun depan mungkin kegiatan IUJK tidak dihapus tetapi nama kegiatannya berganti karena kita tetap melakukan verifikasi lapangan ke badan usaha karena kita tetap mengeluarkan rekomendasi teknis untuk keluarnya surat izin usaha jasa konstruksi tersebut. Yang kedua itu adalah Pelatihan Tenaga Terampil berdasarkan rencana kami akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III, tetapi setelah kami melakukan koordinasi dengan pihak jasa konstruksi pada bulan Februari. Jadwal dari Balai Jasa Konstruksi sangat padat pada Triwulan II. Jadi mereka meminta agar Pelatihan Uji Sertifikasi Jasa Konstruksi dilaksanakan pada Triwulan III saja. Jadi 2 gelombang dilaksanakan pada Triwulan III.

Dari Bapak Ilham, ST, selaku kepala Bidang Penataan Ruang, menjelaskan:

Untuk kegiatan di Bidang Penataan Ruang sejauh ini tidak ada masalah, dan menyampaikan bahwa kegiatan system informasi sudah masuk tahap espose I.

Setelah semua penanggungjawab kegiatan menjelaskan kendala permasalahan dan langkah-langkah yang diupayakan untuk mempercepat realisasi fisik dan penyerapan anggaran, maka rapat dilanjutkan kembali oleh moderator dan menyampaikan sebelum rapat ditutup mengingatkan bahwa hari senin ada evaluasi di DPR dan akan banyak hal yang akan ditanyakan terkait dengan kegiatan di tahun 2020, dan menyiapkan jawaban yang bisa diterima dan terutama terkait PAD. Sebelum rapat ditutup pemimpin rapat meminta kembali kepada para penanggung jawab khususnya kegiatan yang pelaksanaannya mengalami keterlambatan yang tidak sesuai rencana untuk

tetap mengawasi pekerjaan dan tidak segan-segan memberikan teguran secara tertulis bilamana tidak sesuai dengan spesifikasi.

Akhir kata bapak Kepala Dinas selaku Pemimpin rapat menyampaikan pesan untuk ke depan bekerjalah secara hati- hati dan ikuti aturan.

Sinjai, 1 Juli 2021

PEMIMPIN RAPAT,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, ST., MT.
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

NOTULIS,

NURHERMAWATI, ST.
NIP. 19750729 200604 2 022


BERITA ACARA

PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal 1 Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan II, Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan II ini dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan diikuti oleh Para Pejabat Eselon III, IV, dan staf yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Penyampaian Progres fisik pekerjaan masing-masing paket pekerjaan.
2. Masalah keterlambatan dan rencana percepatan dari masing-masing paket pekerjaan untuk setiap lingkup kegiatan

Demikian hasil Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan II untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nazaruddin Taha, ST.	Sekretaris Dinas	
2.	M.Nur Badri Hatta, ST, M.Eng.	Kabid. SDA	
3.	Muhammad Sabri AR, ST., MM.	Kabid. Cipta Karya	
4.	Ilham, ST.	Kabid. Penataan Ruang	
5.	A.Adnan N., S.ST., MT.	Kasi. preservasi Kebinamargaan	
6.	Samsu Alam, ST.	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan	
7.	M.Ridwan Jaya , ST., MM.	Kasi. Pelaksana SDA	

8.	Akmal, S.Sos.	Kasi Pengaturan Jasa Konstruksi	
9.	Nurfah, S.Sos.	Kasi. Pengawasan Jasa Konstruksi	
10.	Abdul Haris, ST.	Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	
11.	Rosmawati, S.Sos.	Kasubbag. Keuangan	
12.	Edy Hafil, SE.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
13.	Nurhermawati, ST.	Kasubbag. Program	
14.	Weni Otaviana, S.Sos.	Staf Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2021**





DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2021

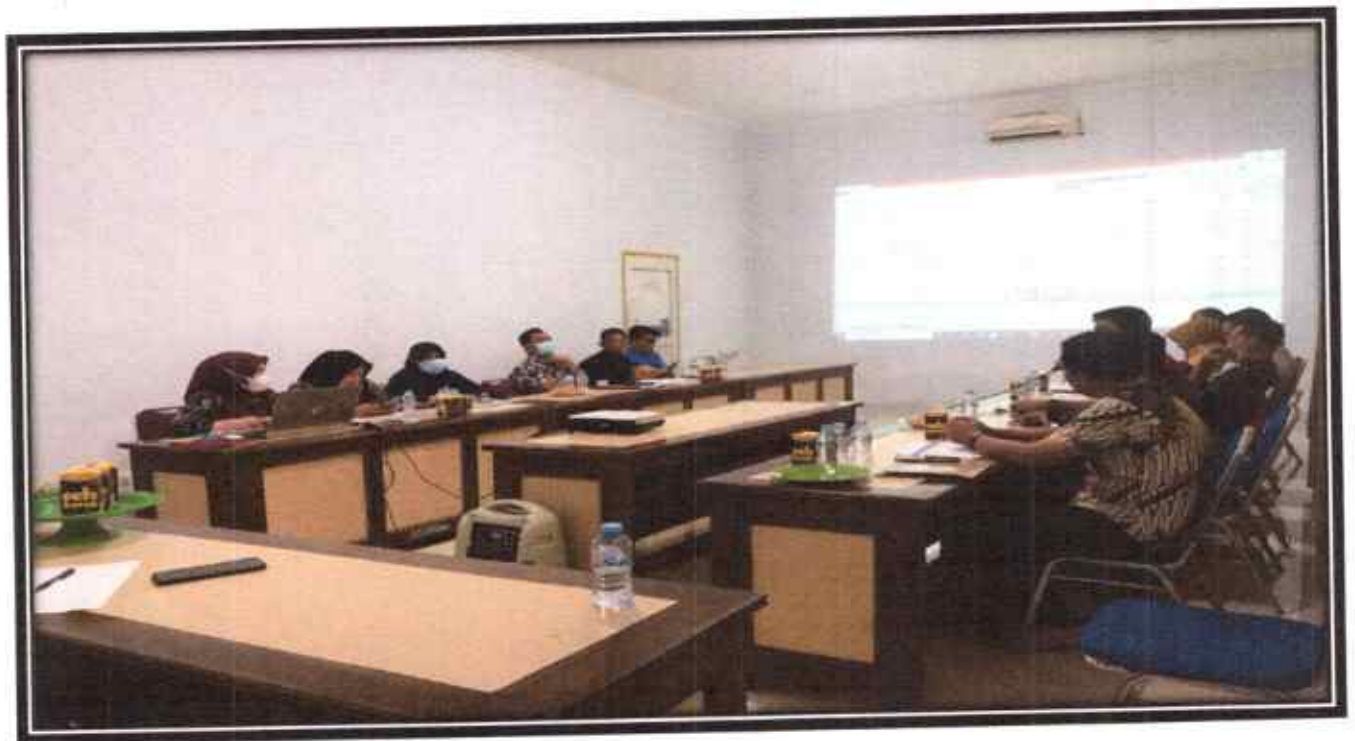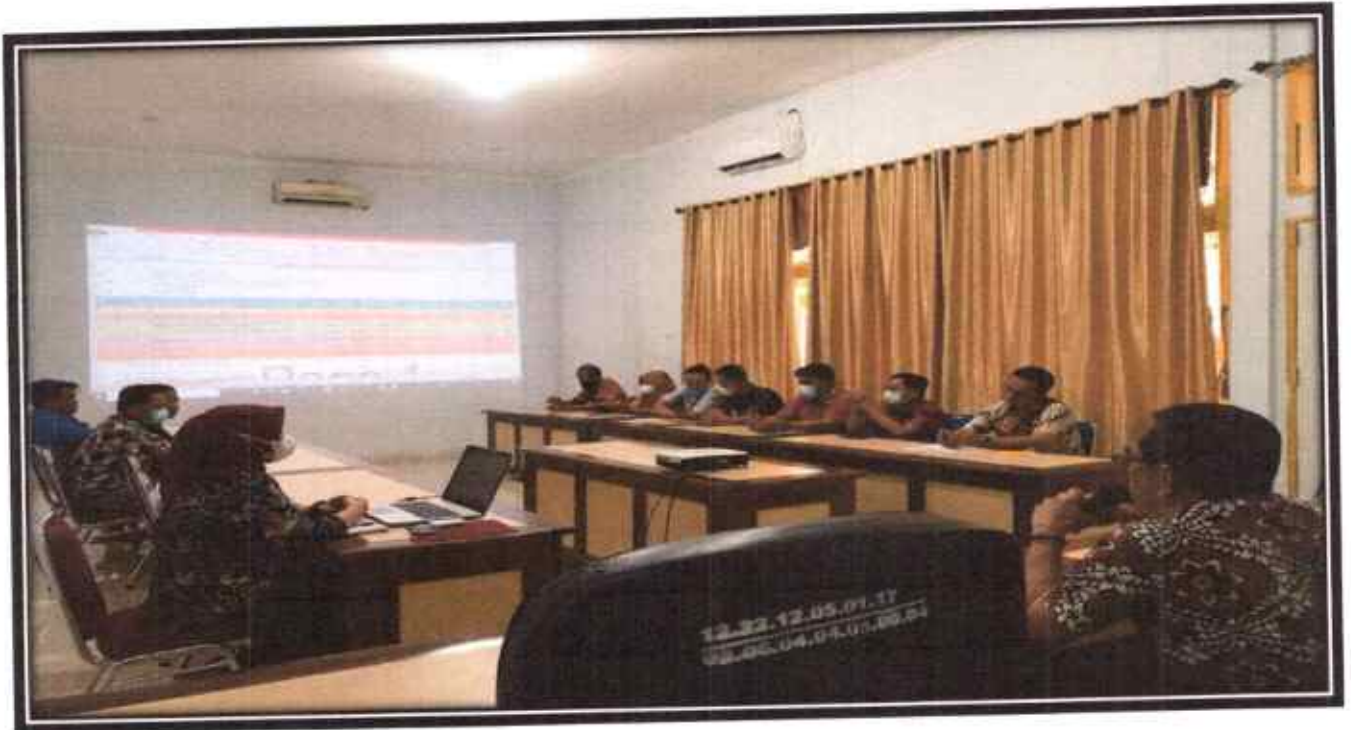

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2021

