



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
TRIWULAN IV
(OKTOBER - DESEMBER 2020)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya juaah sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV (Keempat) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2020.

Sinjai, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIO SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
Nip. 19641214 198903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 TRIWULAN IV(KEEMPAT).....	13
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	13
2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja OPD.....	17
2.3 Kendala Yang Dihadapi.....	43
BAB III PENUTUP.....	45
3.1 Kesimpulan.....	45
3.2 Rekomendasi.....	45
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi

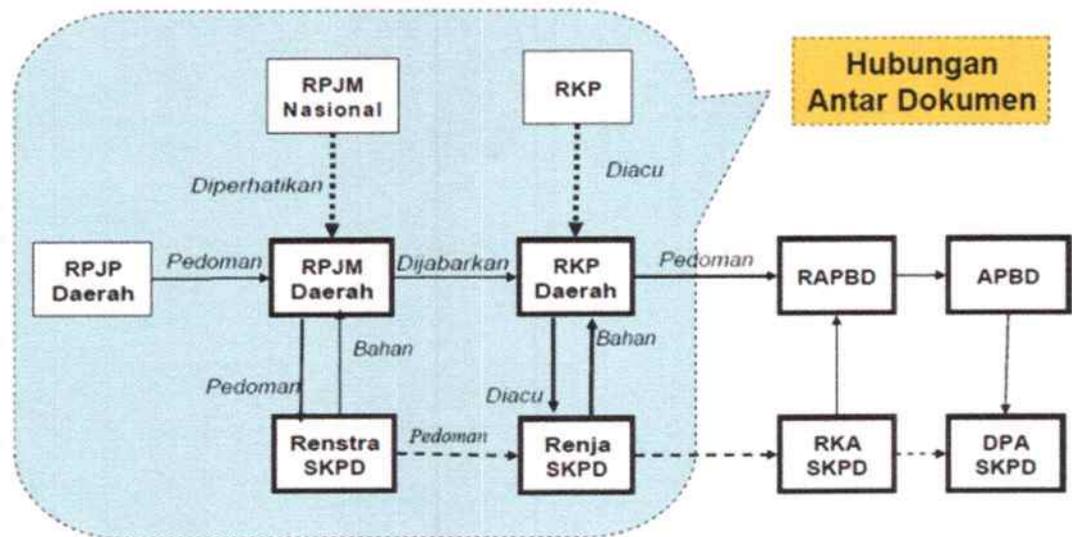

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada kepala dinas, kepala bidang dan

kepala seksi dalam Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016, maka dilakukan perubahan dan penyesuaian, dengan pertimbangan itu maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 3. Seksi Preservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi :
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Penataan Ruang :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Tabel 1.1
 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	
			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan PD	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	1 01 03 01	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	787.993.004,00	
		1 01 03 01 002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan	185.600.000,00	
		1 01 03 01 006	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	65 Unit	71.150.000,00	
		1 01 03 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	4.946.695,00	
		1 01 03 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20.000.000,00	
		1 01 03 01 019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	120.120.000,00	

										Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	13.500.000,00
										Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	101.476.100,00
										Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	30.000.000,00
										Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	150.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	1	01	03	02	001			Program Keciptakarya	Capaian Bangunan Gedung Negara Yang Ditangani	100 %	20.292.431.200,00
		1	01	03	15	001			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun	1 Unit	172.431.200,00
		1	01	03	15	007			Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	20.100.000.000,00
		1	01	03	15	011			Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah dokumen teknis HSBGN	2 Dokumen	20.000.000,00
		1	01	03	15	037			Pengadaan Test Rest Area	Luas Lahan Pengadaan Tanah Rest Area	0 M2	0
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan	1	01	03	16				Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50.30 %	217.265.257.346,00
										Persentase Jembatan	91.79 %	

Wilayah	Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan									Kabupaten Dalam Kondisi Baik		
		1	01	03	16	001		Pemeliharaan Alat-Alat Berat		Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	12 Unit	200.000.000,00
		1	01	03	16	003		Pembangunan Jembatan		Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	6 Buah	25.177.580.700,00
		1	01	03	16	004		Pemeliharaan Jalan		Panjang jalan yang dipelihara	6,45 Km	400.000.000,00
		1	01	03	16	005		Pemeliharaan PJU		Terpeliharanya PJU	300 Buah	1.100.531.396,00
		1	01	03	16	006		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan		Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	204.842.000,00
		1	01	03	16	010		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan		Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jalan	0 Dokumen	0
		1	01	03	16	011		DAK Bidang Jalan		Panjang jalan yang dipelihara	13,81 Km	15.226.449.000,00
		1	01	03	16	012		Peningkatan Jalan		Panjang jalan yang dikerjakan	126,09 Km	174.743.854.250,00
		1	01	03	16	013		Pembangunan Jalan TMMMD/ Karya Bakti TNI		Jumlah perintisan dan pelebaran jalan	1 Ruas	212.000.000,00
Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Yang Handal Untuk Menunjang Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	1	01	03	17	003		Program Pengelolaan Sumber Daya Air		Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	72,76 %	14.671.914.215,00
		1	01	03	17	002		Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara	32 DI	290.000.000,00
		1	01	03	17	003		DAK Bidang Irigasi		Panjang irigasi yang ditingkatkan/ direhab.	10,642 M	14.174.290.215,00

Konstruksi												
	1	01	03	40	003	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	0 Kali				0
	1	01	03	40	004	Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi IUJK	40 BUJK				15.255.300,00

Sumber: Perubahan DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

BAB II

HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 TRIWULAN IV

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Perbandingan RENJA dan RENSTRA Tahun 2020

Kode					Urusan Wajib	Jumlah Kegiatan		Ket
						RENJA	RENSTRA	
1					2	3	4	5
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	01	03	01		Program Pelayanan Perkantoran			
1	01	03	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
1	01	03	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
1	01	03	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	01	019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	√	√	
1	01	03	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	√	√	
1	01	03	01	022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	√	√	
1	01	03	01	026	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	√	√	
1	01	03	01	059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	

1	01	03	01	061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	√	√	
1	01	03	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	02		Program Pelaporan Kinerja	√	√	
1	01	03	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	
1	01	03	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	√	√	
1	01	03	02	015	Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	√	√	
1	01	03	02	016	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	√	√	
1	01	03	15		Program Keciaptakaryaan	√	√	
1	01	03	15	001	Pembangunan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	15	007	Pembangunan Tempat Ibadah	√	√	
1	01	03	15	011	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	√	√	
1	01	03	15	037	Pengadaan Tanah Rest Area	√	√	
1	01	03	16		Program Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	16	001	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	√	√	
1	01	03	16	003	Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	004	Pemeliharaan Jalan	√	√	
1	01	03	16	005	Pemeliharaan PJU	√	√	
1	01	03	16	006	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	010	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	√	√	
1	01	03	16	011	DAK Bidang Jalan	√	√	
1	01	03	16	012	Peningkatan Jalan	√	√	
1	01	03	16	013	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	√	√	


1	01	03	17		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	√	√	
1	01	03	17	002	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	003	DAK Bidang Irigasi	√	√	
1	01	03	17	009	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	18		Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√	√	
1	01	03	18	001	Perencanaan Air Bersih	√	√	
1	01	03	18	004	DAK Penugasan Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	18	006	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	√	√	
1	01	03	18	007	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	√	√	
1	01	03	18	008	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√	√	
1	01	03	19		Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√	√	
1	01	03	19	007	DAK Reguler Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	19	012	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	19	020	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	√	√	
1	01	03	29		Program Penataan Ruang	√	√	
1	01	03	29	017	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)	√	√	
1	01	03	29	021	Pemeliharaan RTH Taman Kota	√	√	
1	01	03	40		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	40	003	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	√	√	
1	01	03	40	004	Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	√	√	

Sumber : DPPA Tahun 2020 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tidak ada program dalam RENJA


yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :

Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2020 dengan Jumlah Program RENSTRA Tahun 2018 – 2023.
DPPA



Jumlah Program dalam RENJA Tahun 2020 sebanyak 9 Program. Jumlah program dalam DPPA Tahun 2020 sebanyak 9 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program DPPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan DPPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program DPPA Tahun 2020.

Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program DPPA dengan Program RENJA Tahun 2020



2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

1. Program Pelayanan Perkantoran :

a. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.600.000,00 dengan target rencana kerja waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun (12 bulan). Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 185.600.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 12 bulan sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 156.848.545,00 atau 84,51% (realisasi sesuai dengan kebutuhan).

b. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;*

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 71.150.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan (65 Unit). Pada triwulan keempat rencana kerja selama 12 bulan (65 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 71.150.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 44.928.118,00 atau 63,15%.

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.947.991,00 setelah perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 4.946.695,00 dengan target rencana kerja waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 12 Bulan (5 Jenis) komponen Instalasi Listrik. Pada Triwulan keempat target kinerja selama 12 bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 4.946.695,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, begitupun dengan realisasi anggarannya.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 12 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 19.985.000,00 atau 99,93%.

- e. **Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;**
Kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.120.000,00 dengan target rencana kerja waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian selama 12 bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 120.120.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 12 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 115.120.000,00 atau 95,84%.
- f. **Pengelolaan Keuangan SKPD;**
Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah laporan administrasi keuangan sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja sebanyak 12 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 49.780.000,00 atau 99,56%.
- g. *Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;*
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.048.309,00 dengan target rencana kerja Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan (100%). Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 174.048.309,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 173.603.036,00 atau 99,74%.

h. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS;

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.456.000,00 dengan target rencana kerja Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS selama 12 bulan (94 Orang), setelah perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 15.228.000,00. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.228.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 8.756.100,00 atau 57,50%, ini disebabkan karena adanya perubahan iuran premi asuransi.

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 1 Unit (100%). Pada Triwulan keempat target kinerja 1 Unit (100%) dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan secara swakelola. Realisasi dari rencana kerja sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 19.994.880,00 atau 99,97%.

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai sebanyak 40 Unit (100%). Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (40 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja selama 12 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak (37 Unit),

begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 66.314.975,00 atau 66,31%. Ini disebabkan karena kurangnya laporan dari penanggungjawab kendaraan terkait pemeliharaan kendaraan.

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.400.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara sebanyak 41 Unit dilakukan pemeliharaan sebanyak 2 kali (100%). pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (41 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 16.400.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target begitupun dengan realisasi anggarannya.

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara sebanyak 30 Unit (100%). Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (30 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target begitupun dengan realisasi anggarannya.

m. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 5 Orang selama 12 bulan. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-

19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00.

2. Program Pelaporan Kinerja

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,00 dengan target Rencana Kerja 1 Dokumen. Pelaksanaan pada kegiatan ini hanya direncanakan selama 3 (tiga) bulan dan ditargetkan pada Triwulan pertama. Kegiatan ini sudah terealisasi sesuai target begitupun dengan anggarannya.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.476.100,00 dengan target rencana kerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD sebanyak 5 Dokumen. pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (5 Dokumen) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 101.476.100,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana, yaitu sebesar Rp. 99.936.100,00 atau 98,48%.

c. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00

dengan target Rencana Kerja Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (12 Laporan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 28.680.000,00 atau 95.60%. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.

d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (12 Laporan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 149.780.000,00 atau 99,85%. Realisasi anggaran sesuai kebutuhan.

3. Program Keciaptakaryaan

Program Keciaptakaryaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.292.431.200,00 yang dananya bersumber dari DAU dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan target indikator kinerja Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani sebesar 100%. Program Keciaptakaryaan mencakup beberapa kegiatan padat karya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja, beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan pembangunan gedung kantor, sesuai tugas pokok dan fungsi bidang cipta karya, pelaksanaan pembangunan gedung menjadi hal yang urgen pada bidang ini. Realisasi kinerja sesuai target sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.664.554.327,00 atau 47,63%. Rendahnya

realisasi anggaran disebabkan karena adanya kegiatan dengan sumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi yang mana pelaksanaan pekerjaan direncanakan selesai di tahun berikutnya. Program Keciptakarya dilaksanankan melalui Kegiatan:

a. *Pembangunan Gedung Kantor;*

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dianggarkan pada perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.431.200,00 dengan target rencana kerja Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun/rehab. Berat sebanyak 1 unit. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 171.095.200,00 atau 99,23%. Realisasi sesuai yang terkontrak.

b. *Pembangunan Tempat Ibadah;*

Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.100.000.000,00 yang bersumber dari Bantuan Dana Provinsi dan DAU dengan target rencana kerja Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun 1 Unit. Kegiatan ini dilakukan dengan kontrak bersyarat dimana rencana realisasi anggaran untuk tahun 2020 sebesar 20% dari pagu kegiatan dan dianggarkan kembali sebesar 80% untuk tahun berikutnya (2021). Realisasi Rencana Kerja belum terukur karena masih dalam tahap pelaksanaan, sedangkan realisasi anggaran sebesar 9.473.459.127,00 atau 47,13%.

c. *Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN);*

Kegiatan Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah dokumen teknis HSGBN sebanyak 2 Dokumen. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan sebanyak 2 Dokumen yang ditetapkan dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, begitupun dengan realisasi anggarannya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 atau 100%.

d. *Pengadaan Tanah Rest Area;*

Kegiatan Pengadaan Tanah Rest Area dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan target rencana kerja Luas lahan pengadaan tanah rest area 36 M2. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00.

4. Program Kebinamargaan

Program Kebinamargaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 217.265.257.346,00 dengan sumber dana dari Pinjaman Daerah, DAU, DAK, DID Tahap I, DID Tahap II, dan DID Tahap III dengan target indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 50,30% dan Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik 91,79%. Realisasi kinerja untuk Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 43,31% sehingga capaian hanya 86,10%, hal ini disebabkan karena kurangnya relokasi anggaran pada kegiatan pemeliharaan jalan dalam mempertahankan kondisi jalan meskipun pada realisasi panjang jalan yang ditangani pada kegiatan peningkatan jalan meningkat. Untuk realisasi Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

91,79% sehingga capaian sebesar 100%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 177.848.136.172,00 atau 81,86%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya paket pekerjaan pada Kegiatan Peningkatan Jalan yang dananya bersumber dari DID Tahap II dan DID Tahap III masih dalam tahap pelaksanaan yang mana pelaksanaannya menggunakan kontrak bersyarat (Tahapan Pelaksanaannya berlanjut ke tahun berikutnya). Program Kebinamargaan dilaksanakan melalui Kegiatan:

a. Pemeliharaan Alat-Alat Berat;

Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah alat berat yang dipelihara 12 Unit selama 12 Bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (12 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yaitu sebanyak 18 Unit atau (150%) kendaraan yang dilakukan pemeliharaan sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 199.955.250,00 atau 99,98%.

b. Pembangunan Jembatan;

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.430.685.600,00 yang bersumber dari dana pinjaman daerah dan DAU dengan target rencana kerja Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat sebanyak 6 buah jembatan. Setelah dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 25.177.580.700,00. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan sebanyak 6 buah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum, realisasi dari rencana kerja sesuai target atau sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang ditetapkan yaitu

sebesar Rp. 24.549.235.700,00 atau 97,50%, sisa anggaran dari selisih pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. *Pemeliharaan Jalan;*

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dengan target rencana kerja Panjang jalan yang dipelihara 18 Km. Dengan adanya Bantuan Dana Provinsi yang ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 914/III/Tahun 2020 untuk penyelesaian Islamic Center dimana peruntukan anggaran untuk pelaksanaan fisik sedangkan untuk perencanaan dan pengawasan dananya bersumber dari DAU, sehingga untuk pemenuhan dana tersebut pagu anggaran kegiatan pemeliharaan jalan dialokasikan sebahagian untuk memenuhi penganggaran perencanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah, sehingga pagu anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan mengalami perubahan menjadi Rp. 400.000.000,00 begitupun dengan target kinerja yaitu Panjang jalan yang dipelihara 6,45 Km selama 12 Bulan. Pada triwulan keempat target rencana kerja 6,45 Km dengan rencana anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja dibawah dari target yaitu 6,32 Km atau 97,98%, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 390.541.822,00 atau 97,64%.

d. *Pemeliharaan PJU;*

Kegiatan Pemeliharaan PJU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.000.000,00 yang bersumber dari DAU dengan target rencana kerja Terpeliharanya PJU sebanyak 300 Buah selama 12 Bulan. Dengan adanya Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Alokasi anggaran pada kegiatan ini mengalami perubahan menjadi Rp. 1.100.531.396,00 begitupun dengan target kinerja sebanyak 500 Buah. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan (500

buah) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.100.531.396,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 354 buah atau 70,80% yang dilakukan pemeliharaan. begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 1.064.152.400,00 atau 96,69%.

e. *Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan;*

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di DPPA Tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 204.842.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan sebanyak 1 Dokumen. Kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran utang kegiatan Tahun sebelumnya (2019), realisasi anggaran sesuai dengan rencana yaitu sebesar Rp. 204.842.000,00 atau 100%.

f. *Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan;*

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.300.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00.

g. DAK Bidang Jalan;

Kegiatan Dak Bidang jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.746.449.000,00 dengan target rencana kerja Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 23,07 Km. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Pada Triwulan II

kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Bidang Jalan sebesar Rp. 15.226.449.000,00 turun dari anggaran sebelumnya begitupun dengan Target rencana kerja Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 13,81 Km. Realisasi kinerja dibawah dari target yaitu Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 13,75 Km atau 99,59%. Begitupun dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.495.299.600,00 atau 95,20%. Sisa anggaran merupakan selisih dari nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

h. Peningkatan Jalan;

Kegiatan Peningkatan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.174.451.250,00 yang bersumber dari dana Pinjaman Daerah dan DAU dengan target rencana kerja Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 118,14 Km. Setelah penyesuaian dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 163.345.543.250,00. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana

Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020, Pagu Kegiatan Peningkatan Jalan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 174.743.854.250,00, begitupun dengan target kinerja sepanjang 126,09 Km. Pada kegiatan ini untuk paket pekerjaan yang bersumber dari DID Periode II dan III dilakukan kontrak bersyarat dan rencana realisasi anggaran hanya sebesar 20% dari pagu anggaran dan 80% dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 132,98 Km, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 136.731.119.350,00 atau 78,24%.

i. Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI;

Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah perintisan dan pelebaran jalan 1 Ruas jalan. Pada triwulan keempat target rencana kerja selama 12 bulan target yang ditetapkan perintisan dan pelebaran jalan 1 Ruas dengan rencana anggaran sebesar Rp. 212.000.000,00 atau 100%. Realisasi kinerja sudah terealisasi sesuai target (100%), sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 211.990.050,00 atau 100%. Sisa anggaran merupakan selisih dari nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.671.914.215,00 dengan target indikator kinerja Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 72,76%. Realisasi kinerja 72,81% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100,07%. Pencapaian indikator ini didukung dengan adanya kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada beberapa Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020. Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.312.987.615,00 atau 97,55%. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui kegiatan:

a. *Pemeliharaan Jaringan Irigasi;*

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara sebanyak 32 DI selama 12 Bulan. Pada perubahan APBD, alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 290.000.000,00 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk pembayaran jasa upah kerja Petugas Pintu Air selama 4 bulan yang sebelumnya dianggarkan hanya 8 bulan. Realisasi rencana kerja sesuai dengan target atau 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 289.994.500,00 atau 100%.

b. *DAK Bidang Irigasi;*

Kegiatan DAK Bidang Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.070.000.000,00 dengan target rencana kerja Panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 10.642 M. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem pelelangan umum. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Bidang Irigasi sebesar Rp. 13.070.000.000,00 sama dengan Pagu Awal dengan Target rencana kerja Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab sepanjang 10.642 M. Pada Perubahan APBD alokasi anggaran sebesar Rp. 14.174.290.215,00 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 1.104.290.215,00 untuk pembayaran utang dan Dipdal kegiatan Dak Bidang Irigasi Tahun 2019. Realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Panjang irigasi yang ditingkatkan /direhab sepanjang 12.701,6 Meter atau 119,35%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 13.815.379.215,00 atau 97,47%. Sisa anggaran merupakan selisih pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. *Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;*

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di DPPA Tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.624.00,00 dengan target rencana kerja Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi sebanyak 2 Dokumen. Dokumen perencanaan ini merupakan salah satu persyaratan pengusulan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021. Realisasi kinerja sesuai target atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 207.613.900,00 atau 100%.

6. Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pemerintah terus berupaya keras mewujudkan 100% akses air minum aman dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Target tersebut dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, PDAM, BUMN, Badan Usaha dan masyarakat. Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemerintahan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak.

Selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum 4,5% pertahun oleh sebab itu, penting untuk menerapkan strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100% dimana peran Stakeholder terkait menjadi sangat penting.

Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.877.211.829,00 dengan sumber dana dari DAU, DAK, DID Tahap II dengan target indikator kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 75,64% dengan capaian kinerja 75,64% dibawah dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya pencapaian kinerja salah satunya disebabkan karena adanya Refocusing anggaran di Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penganggaran pada kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum mengalami perubahan yang signifikan yang pengaruhnya sangat besar pada target pencapaian keluaran yang menunjang pencapaian kinerja program. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Kegiatan Perencanaan Air Bersih, Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum, Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan, dan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.733.348.620,00 atau 41,31% Rendahnya realisasi anggaran karena adanya

kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun dengan sumber dana dari DID Tahap II yang pada pelaksanaannya menggunakan kontrak bersyarat (Tahapan Pelaksanaannya berlanjut ke tahun selanjutnya). Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui Kegiatan:

a. *Perencanaan Air Bersih;*

Kegiatan Perencanaan Air Bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum sebanyak 1 Dokumen. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00. Pada Perubahan APBD, Kegiatan ini kembali dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,00 untuk pemenuhan dokumen perencanaan sebagai salah satu persyaratan dalam pengusulan DAK tahun 2022. Realisasi kinerja sesuai target atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 89.392.100,00 atau 99,32%. Sisa anggaran merupakan selisih antara pagu dengan nilai yang terkontrak.

b. *DAK Penugasan Bidang Air Minum;*

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.056.487.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 13 Unit (2.285 RT). Pada Kegiatan ini

dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum sebesar Rp. 2.928.487.000,00 turun dari anggaran sebelumnya begitupun dengan Target rencana kerja Jumlah pembangunan system penyediaan air minum sebanyak 5 Unit. Pada Triwulan IV realisasi kinerja sesuai dengan target atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 2.753.493.828,00 atau 94,02%. Sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. *Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan;*

Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 1 Unit (1570 RT). Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan

rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00. Pada perubahan APBD kegiatan ini kembali dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dengan dana yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020. Pada kegiatan ini dilakukan kontrak bersyarat dan rencana realisasi anggaran hanya sebesar 20% dari pagu anggaran dan 80% dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021. Realisasi rencana kerja belum bisa terukur sesuai target yang telah ditetapkan karena baru dimulai tahap pelaksanaan pekerjaan, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.031.737.863,00 atau 20,32%.

d. *Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);*

Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.700.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 2 Unit (1.350 RT). Pada Perubahan APBD alokasi anggaran sebesar Rp. 663.100.000,00 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 55.400.000,00 untuk pembayaran utang kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2019. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja sesuai

dengan target atau 100%, begitupun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 663.100.000,00 atau 100%.

e. *Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);*

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kegiatan baru pada perubahan APBD Tahun 2020. Kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran utang kegiatan Tahun 2019. Target kegiatan tidak ada karena sudah terhitung tahun sebelumnya dengan rencana anggaran sebesar Rp. 195.624.829,00. Realisasi anggaran sesuai rencana yaitu sebesar Rp. 195.624.829,00 atau 100%.

7. Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Air Limbah Domestik

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019.

Menjawab tantangan universal sanitasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat (on site system) sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site system) dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.

Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.037.609.100,00 sumber dana dari DAK dan DAU dengan target tiga indikator kinerja yaitu Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 100%, Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air 0,60%, dan Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 84,00%. Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi sebesar 88,50% dengan capaian kinerja 88,50% dibawah dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya pencapaian kinerja salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait kebijakan refocusing anggaran covid 19 menyebabkan beberapa paket-paket pekerjaan dihilangkan sehingga berdampak pada berkurangnya pembangunan/peningkatan akses sanitasi. Sedangkan realisasi kinerja Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air dan Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 0%, hal ini disebabkan karena tidak ada kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.948.802.100,00 atau 95,64%. Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui kegiatan:

a. DAK Reguler Bidang Sanitasi;

Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sebanyak 2 Unit (100 RT). Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola.. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

b. DAK Penugasan Bidang Sanitasi;

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.768.607.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi sebanyak 40 Unit (2.000 RT). Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pemerintah kembali mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alokasi Cadangan DAK Fisik untuk Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi sebesar Rp. 1.988.207.000,00 turun dari anggaran sebelumnya begitupun dengan Target rencana kerja Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sebanyak 36 Unit. Realisasi kinerja sesuai target atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp1.889.400.000,00 atau 95,53%.

c. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;

Pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana air limbah dengan pengalokasian dana sebesar Rp. 49.402.100,00,

kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melayani rumah tangga yang membutuhkan layanan sedot tinja, untuk layanan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 2 armada yang selalu siap untuk melayani rumah tangga yang membutuhkan layanan penyedotan tinja.

Target kinerja untuk tahun 2020 sebesar 30 RT dan terealisasi sesuai target. Capaian kinerja ini didukung oleh tim satgas IPLT serta sosialisasi yang terus menerus melalui brosur, begitupun dengan realisasi anggaran sesuai rencana yaitu sebesar Rp. 49.402.100,00 atau 100%.

8. Program Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang merupakan salah satu aspek utama dalam penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, Ketidaksihinggaan atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, maka dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini

yang menjadi alasan perlunya dilaksanakan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Program Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.133.200,00 sumber dana dari DAU dengan dua target indikator kinerja yaitu Ketaatan Terhadap RTRW 4,76 dan Rasio Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber-HPL/HGB 0,05. Rasio Ketaatan terhadap RTRW 4,76 merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana ketaatan masyarakat di Kabupaten Sinjai dalam mengikuti arahan dalam pemanfaatan ruang, target tersebut tercapai dengan adanya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berupa rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau TKPRD.

Adapun Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 0,05 ditahun 2020 tidak bertambah dan berkurang disebabkan tidak adanya penambahan Ruang Terbuka Hijau yang diupayakan untuk memiliki HPL/HGB, Upaya peningkatan ini dapat terwujud melalui pembebasan lahan untuk kebutuhan Taman baik itu di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di Ibu Kota Kelurahan/Desa yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau dan dapat dipertahankan fungsinya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 119.362.500,00 atau 98,54%. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD);

Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.638.900,00 dengan target rencana kerja Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebanyak 12 Rekomendasi. Pada perubahan APBD kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 32.313.900,00. Realisasi kinerja melebihi target yaitu Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebanyak 24 rekomendasi atau 200%, sedangkan realisasi anggaran

di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 30.736.400,00 atau 95,12%.

b. Pemeliharaan RTH Taman Kota;

Kegiatan Pemeliharaan RTH Taman Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.494.300,00 dengan target rencana kerja Jumlah Ruang terbuka hijau di ibu kota sebanyak 2 Lokasi yang dilakukan pemeliharaan. Pada Perubahan APBD alokasi anggaran sebesar Rp. 88.819.300,00 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 17.325.000,00 untuk belanja bahan/material untuk pemeliharaan taman. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 88.626.100,00 atau 99,78%.

9. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.255.300,00 sumber dana dari DAU dengan target indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) 100%. Realisasi kinerja sebesar 40% di bawah dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya pencapaian kinerja disebabkan karena Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) sudah tidak aktif. Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah kegiatan Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.255.300,00 atau 100%. Program Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi;

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.287.100,00 dengan target rencana kerja Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan/perundang-undangan yang disosialisasikan sebanyak 1 Kali (25 Orang). Dalam

rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00

b. Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Kegiatan Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.255.300,00 dengan target rencana kerja Jumlah Rekomendasi IUJK sebanyak 40 BUJK (100%). Pada triwulan keempat target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 40 BUJK, dengan rencana anggaran sebesar 15.255.300,00 atau 100%. Realisasi rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah rekomendasi IUJK sebanyak 14 atau 40%, sedangkan realisasi anggaran sesuai rencana yaitu sebesar Rp. 15.255.300,00 atau 100%.

2.3 Kendala Yang Dihadapi

Rendahnya capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan IV (keempat) disebabkan karena adanya kegiatan yang baru mulai dilaksanakan dan adanya kegiatan yang sementara berproses.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini:

- ✚ Rata-rata kegiatan fisik pada triwulan III dan triwulan IV baru terkontrak.

- ✦ Proses pelaksanaan, dimana waktu di awal pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal tidak sesuai (pelaksanaan kegiatannya terlambat).

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV (keempat) masih jauh dari sempurna, ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal.

Adapun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

✚ Capaian Kinerja = 83,85 % (SR)

✚ Capaian Anggaran = 78,73% (SR)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan IV (keempat) ini kategori Tinggi, tetapi tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, tetapi ini bukan karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana tetapi karena adanya sebahagian Program dan Kegiatan tersebut dalam penentuan kinerja dan anggaran direncanakan pada Tahun berikutnya yang kegiatannya bersumber dari dana DID Tahap II dan DID Tahap III.

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV (keempat) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2020 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

3.2 Rekomendasi

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV (keempat) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan IV (keempat), sehingga untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yaitu:

- ✿ Penyusun program dan kegiatan diharapkan mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang sudah ditetapkan;
- ✿ Perlu adanya komitmen SKPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD Tahun 2020 dan melaporkan kepada BAPPEDA setiap triwulan sesuai dengan format evaluasi renja SKPD;
- ✿ SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD;
- ✿ Meningkatkan kinerja SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang ada saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang capaian kerjanya masih rendah.

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Sinjai, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIO SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

**Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional
Kabupaten Singaj
Semester II Tahun 2020**

Kabupaten : Singaj
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Periode Ranja SKPD : Triwulan IV

No	Kode	Uraian/Indikator/Program/Struktur Organisasi dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kegiatan/Output	Target B1 (JMD) pada akhir periode RPJMD (RPJMD2021)			Pencapaian (JMD) Bawahan SKPD s.d. Triwulan SKPD Tahun lalu			Pencapaian (JMD) Bawahan SKPD tahun berjalan yang s.d. Triwulan SKPD Tahun ini			Realisasi (JMD) Perak. Triwulan			Realisasi (JMD) dan Anggaran RPJMD tahun berjalan yang s.d. Triwulan SKPD Tahun 2020			Target Capaian Anggaran RPJMD Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020			Tingkat Capaian Kinerja dan Pencapaian RPJMD Tahun 2020	RPJMD Periode Ranja SKPD							
				K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%			K	Rp	%				
<p align="center">Usaha / Realisasi</p> <p align="center">Meliputi Usaha</p>																																	
1	1.01.01.01	Program Pelayanan Publik	Capaian Realisasi Pelayanan Publik	15.932.214.914,00			1.647.298.538,00			787.883.004,00			118.876.654,00			148.035.774,00			172.286.872,00			348.771.948,00			887.777.548,00			118.876.654,00			118,88%	118,88%	
1	1.01.01.01	001	Waktu pemenuhan jasa	60,00 Bulan	1.220.420.200,00	12,00 Bulan	140.178.964,00	12,00 Bulan	165.600.000,00	185,600,000,00	3,00	32.480.250,00	3,00	45.204.896,00	3,00	32.165.957,00	3,00	43.972.026,00	12,00	136.948.946,00	100,00	64,51	24,00	297.927.900,00	40,00	24,00	19.445,100%	40,00	24,00	118,88%	118,88%		
2	1.01.01.01	001	Waktu pemenuhan jasa	360,00 Lmt	599.968.961,00	64,00 Lmt	43.892.186,00	71.150.000,00	71.150.000,00	4.786.220,00	18,00	5.522.190,00	21,00	15.913.816,00	16,00	19.162.940,00	65,00	44.539.118,00	100,00	44.539.118,00	100,00	63,15	129,00	68.790.716,00	30,69	14,00	19.445,100%	30,69	14,00	118,88%	118,88%		
3	1.01.01.01	012	Waktu pemenuhan jasa	60,00 Bulan	41.028.420,00	12,00 Bulan	5.128.891,00	4.946.026,00	4.946.026,00	4.946.026,00	3,00	2.863.600,00	3,00	0,00	0,00	3.042.966,00	100,00	4.946.026,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	1.01.01.01	015	Waktu pemenuhan jasa	60,00 Bulan	54.468.484,00	12,00 Bulan	22.985.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	3,00	4.786.000,00	3,00	5.195.000,00	3,00	4.960.000,00	100,00	19.985.000,00	100,00	19.985.000,00	100,00	95,93	34,00	43.900.000,00	40,00	26,10	19.445,100%	40,00	26,10	118,88%	118,88%		
5	1.01.01.01	016	Waktu pemenuhan jasa	60,00 Bulan	86.427.420,00	12,00 Bulan	123.990.360,00	120.120.000,00	120.120.000,00	120.120.000,00	3,00	26.662.000,00	3,00	19.404.000,00	3,00	23.227.500,00	100,00	115.120.000,00	100,00	115.120.000,00	100,00	96,84	34,00	239.973.000,00	40,00	26,01	19.445,100%	40,00	26,01	118,88%	118,88%		
6	1.01.01.01	020	Waktu pemenuhan jasa	60,00 Bulan	32.989.500,00	12,00 Bulan	49.690.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	3,00	8.071.600,00	3,00	15.823.800,00	3,00	7.820.000,00	100,00	49.780.000,00	100,00	49.780.000,00	100,00	95,96	24,00	79.400.000,00	40,00	30,54	19.445,100%	40,00	30,54	118,88%	118,88%		
7	1.01.01.01	021	Waktu pemenuhan jasa	100,00 %	4.564.977.150,00	100,00 %	490.336.646,00	174.048.300,00	174.048.300,00	174.048.300,00	25,00	33.842.726,00	25,00	41.914.804,00	25,00	61.091.853,00	100,00	173.803.036,00	100,00	173.803.036,00	100,00	90,74	200,00	864.138.694,00	200,00	14,49	19.445,100%	200,00	14,49	118,88%	118,88%		
9	1.01.01.01	026	Waktu pemenuhan jasa	60,00 Bulan	136.404.000,00	12,00 Bulan	14.836.900,00	15.288.000,00	15.288.000,00	15.288.000,00	3,00	0,00	3,00	8.694.000,00	3,00	8.300,00	100,00	8.300,00	100,00	8.300,00	100,00	97,90	24,00	23.966.000,00	40,00	17,08	19.445,100%	40,00	17,08	118,88%	118,88%		
9	1.01.01.01	026	Waktu pemenuhan jasa	60,00 Lmt	24.001.000,00	1,00 Lmt	29.627.300,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	5.049.400,00	0,00	0,00	0,00	14.948.780,00	100,00	19.948.000,00	100,00	19.948.000,00	100,00	99,97	2,00	49.822.980,00	40,00	15,86	19.445,100%	40,00	15,86	118,88%	118,88%		
10	1.01.01.01	026	Waktu pemenuhan jasa	200,00 Lmt	1.246.794.656,00	20,00 Lmt	79.886.990,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1,00	486.000,00	1,00	11.829.800,00	1,00	11.829.800,00	100,00	68.314.975,00	100,00	68.314.975,00	100,00	66,21	57,00	140.003.004,00	27,94	11,20	19.445,100%	27,94	11,20	118,88%	118,88%		
11	1.01.01.01	026	Waktu pemenuhan jasa	200,00 Lmt	111.309.200,00	34,00 Lmt	1.246.794.656,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	11,00	2.400.000,00	11,00	2.400.000,00	11,00	3.600.000,00	100,00	15.400.000,00	100,00	15.400.000,00	100,00	100,00	75,00	29.300.000,00	26,69	26,22	19.445,100%	26,69	26,22	118,88%	118,88%		
12	1.01.01.01	026	Waktu pemenuhan jasa	180,00 Lmt	130.754.440,00	22,00 Lmt	7.760.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	6,00	1.400.000,00	6,00	1.400.000,00	6,00	7.000.000,00	100,00	9.500.000,00	100,00	9.500.000,00	100,00	100,00	52,00	18.200.000,00	34,67	13,81	19.445,100%	34,67	13,81	118,88%	118,88%		
13	1.01.01.01	026	Waktu pemenuhan jasa	157,00 Orang	31.790.000,00	6,00 Orang	31.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p align="right">Rata-rata capaian Kinerja (%)</p>																																	
<p align="right">Prevalensi Kinerja</p>																																	
<p align="right">81,23</p>																																	
<p align="right">82,24</p>																																	
<p align="right">47,86</p>																																	
<p align="right">47,86</p>																																	

No	Kategori	Uraian / Keterangan	Program / Kegiatan	Jumlah / Luas / Volume	Satuan	Tipe	Materi / Bahan	Kategori	Keterangan	Rincian Anggaran (Rp)										Dana PUPR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466

**L
A
M
P
-
R
A
N**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21649 - 21489 SINJAI 92613

Sinjai, 28 Desember 2020

Kepada

Nomor : 800 / 06.149 / DPUPR / XI / 2020 YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
Sifat : Penting 2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
Lampiran : - 3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
Perihal : Evaluasi Rencana Aksi dan 4. Para Kasubbag. Dinas PUPR
Rencana Kerja Triwulan IV Tahun
Anggaran 2020

Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian sampai triwulan IV Tahun 2020 pada Sub Bagian Program paling lambat tanggal 4 Januari 2021.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21048 - 21488 SINJAI 92813

Sinjai, 28 Desember 2021

Kepada

Nomor : 800/06.151/DPUPR/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2020

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR;
5. Staf Dinas PUPR;
Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka akan dilakukan rapat evaluasi kinerja lingkup Dinas.

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Saudara(i) agar menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 Januari 2021
Waktu : 13.30 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP.1964 1214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92613

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : Ruang Rapat DPUPR Kab. Sinjai
Tanggal/Bulan/Thn : 6 Januari 2021
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan Rencana kerja
Triwulan IV Tahun Anggaran 2020

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI TAUFIQ SALEH	KADIS	1.
2.	Nazaruddin Eka	SEK	2.
3.	NURHERMAWATI	KASUBAG. PROGRAM	3.
4.	A. SARFUDDIN	KASUB. SDA	4.
5.	ILHAM	KABID P. RUANG	5.
6.	SARMI	KABID CPTA KAPSA.	6.
7.	ADNAN NADJAMUDDIN	KASI. PRESEVASI	7.
8.	M. Ridwan Jaya	Kasi OP. SDA	8.
9.	Andi Asrul yadi	Kasi Pehusann Jung	9.
10.	ABDUL HARISS	Kasi Pengaturan Perumahan	10.
11.	AZHAR	KASI PUP & AIR MINUM	11.
12.	HERMAN HATTA	Kasi Perenc. CK	12.
13.	H. ABD. ASIS	KASI Perenc. SDA.	13.
14.	SAMSU ALAM	KASI. Perenc. BM	14.
15.	RUSTAN EFANSI	Kasi Pemb. BM	15.
16.	ROSUAWATI	KASUBAG. keon	16.
17.	AKMAL	Kasi Jaker	17.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI N.O. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013

18.	Wern Ouwiana		18.
19.	M NURBADI HATTA		19.
20.	Sultan asyad		20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Sinjai,

Kasubbag. Program,

Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. Andi Taufiq Saleh, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020

- Hari/Tanggal : Rabu, 6 Januari 2021
- Pukul : 13.30 Wita s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Sinjai
- Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
- Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
- Moderator : Sekretaris
- Notulis : Kasubbag. Program
- Peserta Rapat :
1. Kabid. SDA
 2. Kabid. Cipta Karya
 3. Kabid. Penataan Ruang
 4. Kasi. Preservasi Kebinamargaan
 5. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan
 6. Kasi. Pembangunan Kebinamargaan
 7. Kasi. Perencanaan SDA
 8. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA
 9. Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
 10. Kasubbag. Keuangan

11. Kasi. Pengaturan Jasa Konstruksi
12. Kasi. Pengawasan Jasa Konstruksi
13. Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
14. Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
15. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya
16. Kasi. Pelaksanaan Penataan Ruang
17. Staf Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)

Materi Rapat:

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja triwulan IV, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas selaku Moderator dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat untuk membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Rapat terkait kinerja pertama kali dilakukan pada tahun 2021 dan meminta agar kedepannya tetap melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan agar kendala yang dihadapi cepat teratasi, dan untuk mempersingkat waktu pemimpin rapat kembali mempersilahkan moderator untuk mengendalikan rapat.

Penyampaian kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020:

1. **Dari Bapak M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng.**, selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman sekaligus PPK Kegiatan (Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Tempat Ibadah, Pembangunan jalan TMMD/Karya Bakti TNI)
 - a. Kegiatan Pembangunan jalan TMMD/Karya Bakti TNI dan Pembangunan Gedung Kantor terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
 - b. Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah
Permasalahan:

Pada awal pelaksanaan pekerjaan sangat lambat sehingga ada rasa khawatir akan pemenuhan realisasi fisik sampai akhir tahun bisa mencapai 70% sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dana bantuan keuangan, sehingga pada saat penyusunan RKA Tahun 2021 belum dianggarkan karena takutnya realisasi tidak bisa dipenuhi harus menjadi beban daerah sedangkan Dana Alokasi Umum sangat terbatas, tetapi diakhir bulan desember perhitungan realisasi fisik bisa mencapai 70%. Untuk penganggaran direncanakan pada saat perubahan anggaran Tahun 2021.
2. **Dari Bapak Muhammad Sabri AR, ST., MM.** selaku Kepala Bidang Cipta Karya PPK Kegiatan (Perencanaan Air Bersih, DAK Penugasan Bidang Air Minum, Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan)
 - a. Kegiatan Perencanaan Air Bersih, dan Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum terealisasi sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, hanya saja pada kegiatan DAK Penugasan Bidang

Air Minum anggaran tidak terealisasi sebesar 100% karena adanya selisih kontrak dan sebahagian biaya penunjang tidak bisa digunakan karena aturan biaya penunjang maksimal 5% dari total anggaran pekerjaan paket fisik

- b. Kegiatan Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan sudah berjalan namun realisasi fisik diakhir bulan desember baru 12,63%, anggaran yang direncanakan pada tahun 2020 baru uang muka sebesar 20% dan sudah dianggarkan pada pokok 2021.

3. **Dari Bapak Andi Adnan, S.ST., MT.,** selaku Kepala Seksi Preservasi Kebinamargaan, Plt. Kepala Bidang Bina Marga sekaligus PPK/PPTK (Peningkatan jalan. Pemeliharaan jalan, Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Pemeliharaan PJU

Mengatakan bahwa dari Kegiatan Pemeliharaan jalan dari target 6,45 Km hanya terealisasi sepanjang 6,32 Km, hal ini disebabkan adanya perubahan volume pekerjaan dimana beberapa ruas jalan mengalami penambahan volume pekerjaan sebagai akibat bertambahnya tingkat kerusakan ruas jalan yang akan dipelihara dan membutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk masing-masing ruas jalan tersebut, sehingga secara langsung mempengaruhi target kegiatan sebelumnya.

Untuk Kegiatan PJU, kegiatan pemeliharaan yang menggunakan DID Tahap I hanya pengadaan yang dilakukan dan sudah terealisasi sesuai yang terkontrak hanya saja untuk sampai pemasangan tidak dilakukan karena mengingat waktu pelaksanaan sangat terbatas sampai pada pemasangan sehingga dalam kontrak tidak dimasukkan. Rencana Pemasangan akan dilaksanakan di awal tahun 2021.

Kegiatan Peningkatan jalan sampai pada akhir bulan Desember masih ada 2 paket yang belum selesai dan rekanan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tetap

memberlakukan denda sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegiatan pembangunan jembatan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 4., **Dari Bapak A. Sarifuddin, ST., MT.**, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air sekaligus PPK Kegiatan (DAK Bidang Irigasi dan Dak Bidang Jalan)

Kegiatan DAK Bidang Irigasi dan DAK Bidang Jalan semua terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hanya saja pada kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan anggaran tidak terealisasi sebesar 100% karena adanya selisih kontrak dan sebahagian biaya penunjang tidak bisa digunakan karena aturan biaya penunjang maksimal 5% dari total anggaran pekerjaan paket fisik

Setelah semua penanggungjawab kegiatan menjelaskan kendala permasalahan dan langkah-langkah yang diupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran, maka rapat dilanjutkan kembali oleh pemimpin rapat sekaligus mengakhiri rapat yang sebelumnya meminta kembali kepada para penanggung jawab khususnya kegiatan yang berlanjut di tahun 2021 untuk tetap mengawasi pekerjaan dan tidak segan-segan memberikan teguran secara tertulis bilamana tidak sesuai dengan spesifikasi.

Akhir kata bapak Kepala Dinas selaku Pemimpin rapat menyampaikan pesan untuk ke depan bekerjalah secara hati-hati dan ikuti aturan.

Sinjai, 6 Januari 2021

PEMIMPIN RAPAT,





Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, ST., MT.
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010


NOTULIS,


NURHERMAWATI, ST.
NIP. 19750729 200604 2 022

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2020**

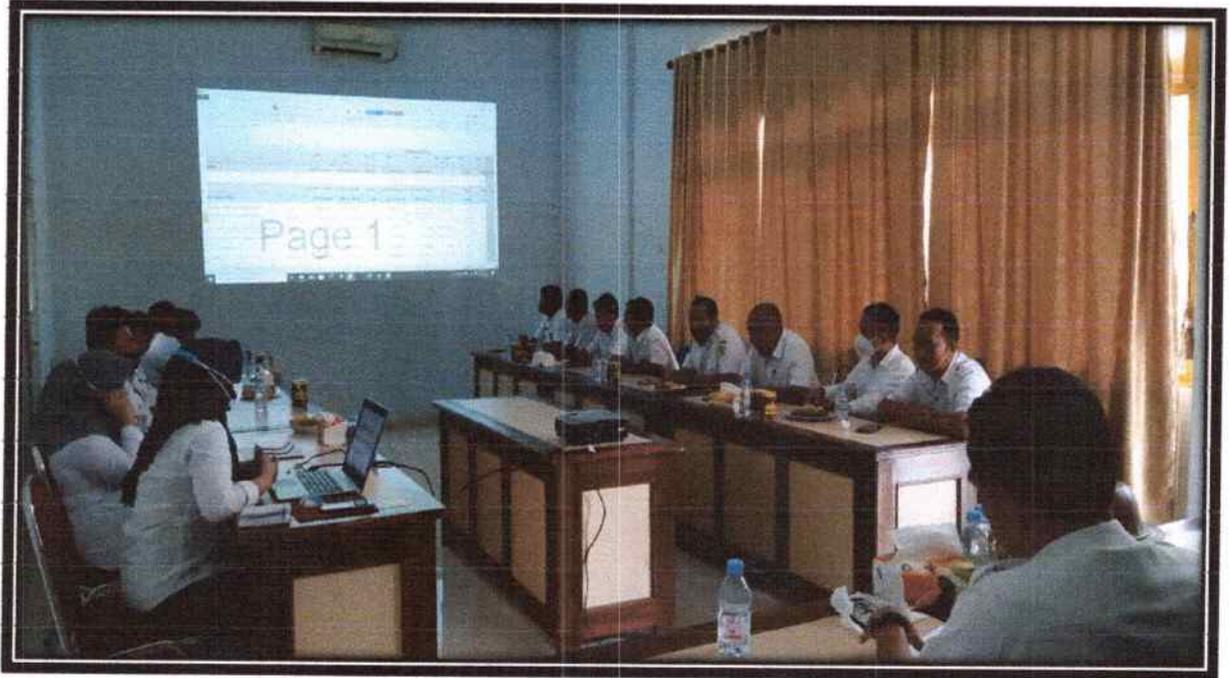

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2020**

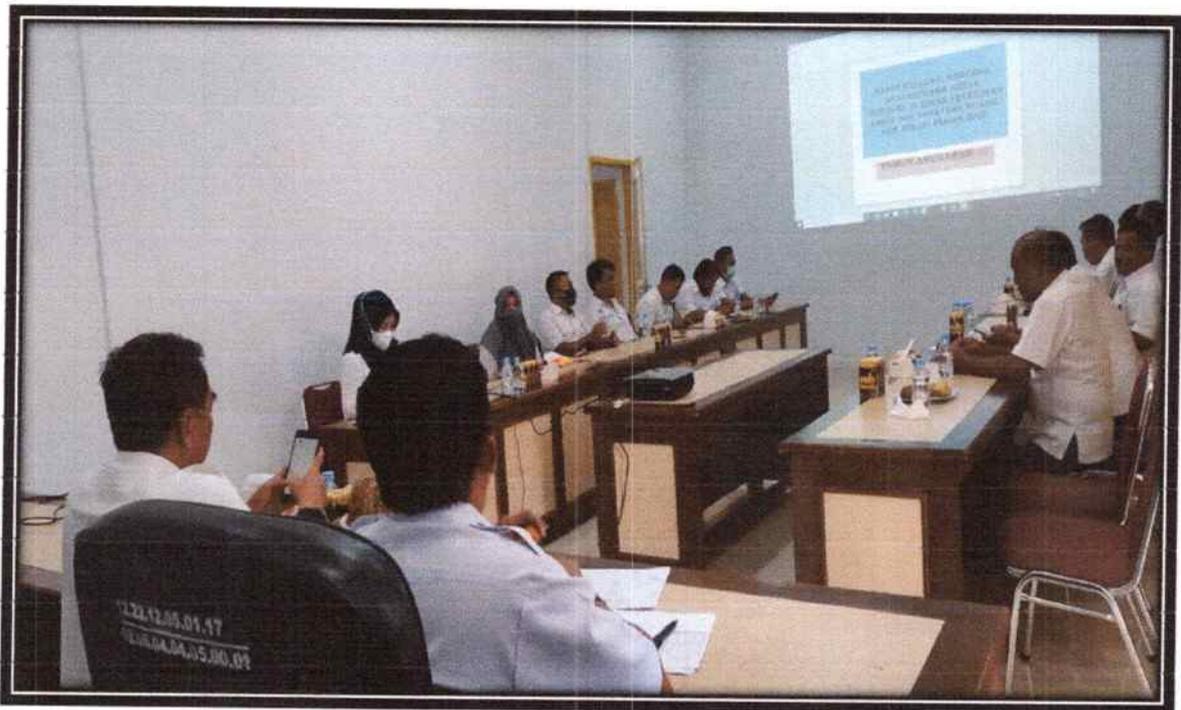

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2020**

